


Burndown Charts

Gráficos de Trabajo Pendiente — Proyecto "El Zapatito"

Historial del progreso diario del equipo midiendo los Puntos de Historia (SP) pendientes de resolver en cada Sprint durante los 10 días laborables.


Gráficas de Progreso

Burndown Chart — Sprint 1

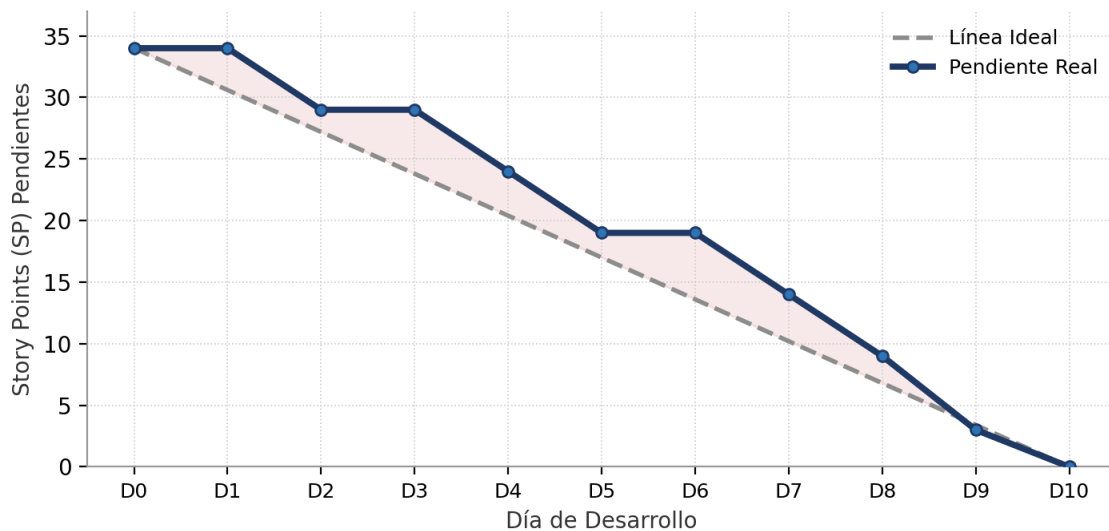


Sprint 1 — Pendiente Real vs. Línea Ideal (34 SP)

Burndown Chart — Sprint 2

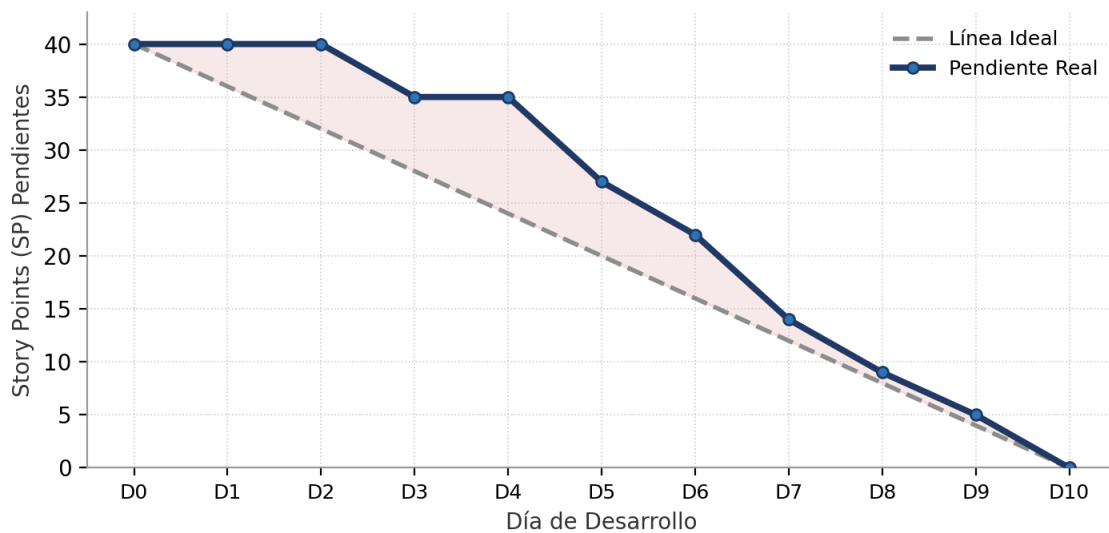

Sprint 2 — Pendiente Real vs. Línea Ideal (40 SP)

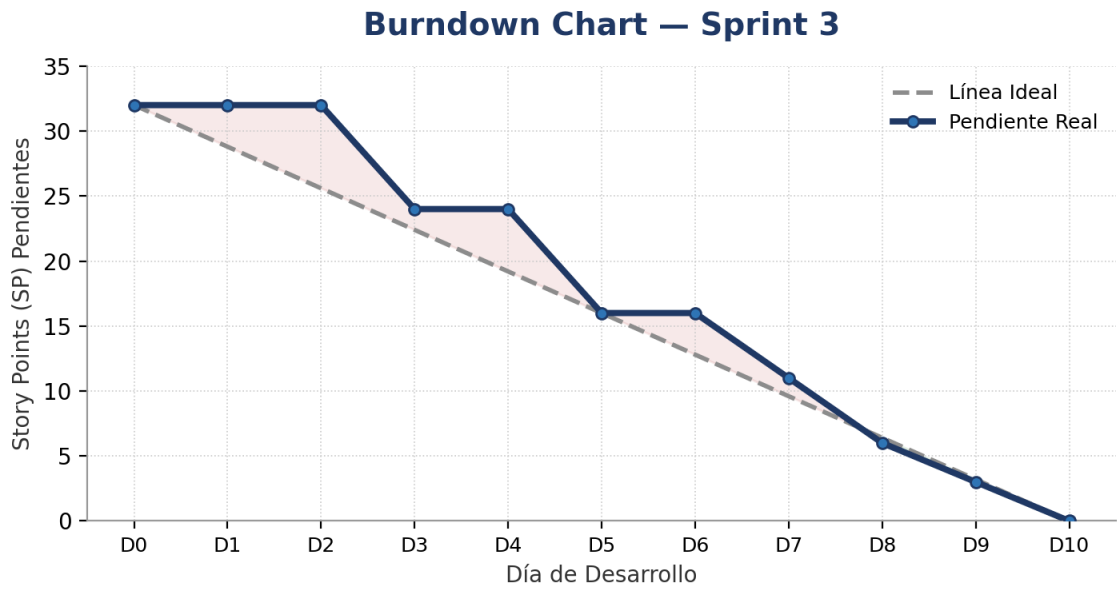

Sprint 3 — Pendiente Real vs. Línea Ideal (32 SP)

Tabla de Datos de Trabajo Pendiente

Día de Desarrollo	Sprint 1 (Pendiente / Ideal)	Sprint 2 (Pendiente / Ideal)	Sprint 3 (Pendiente / Ideal)
Inicio (D0)	34 / 34 SP	40 / 40 SP	32 / 32 SP
Día 1	34 / 30.6 SP	40 / 36.0 SP	32 / 28.8 SP
Día 2	29 / 27.2 SP	40 / 32.0 SP	32 / 25.6 SP
Día 3	29 / 23.8 SP	35 / 28.0 SP	24 / 22.4 SP
Día 4	24 / 20.4 SP	35 / 24.0 SP	24 / 19.2 SP
Día 5 (Mitad)	19 / 17.0 SP	27 / 20.0 SP	16 / 16.0 SP
Día 6	19 / 13.6 SP	22 / 16.0 SP	16 / 12.8 SP
Día 7	14 / 10.2 SP	14 / 12.0 SP	11 / 9.6 SP
Día 8	9 / 6.8 SP	9 / 8.0 SP	6 / 6.4 SP
Día 9	3 / 3.4 SP	5 / 4.0 SP	3 / 3.2 SP
Fin (D10)	0 / 0.0 SP	0 / 0.0 SP	0 / 0.0 SP

Análisis y Lectura del Progreso

Sprint 1:

El equipo se mantuvo ligeramente por encima de la línea ideal a mitad del ciclo debido a problemas de CORS, pero aceleró en la segunda semana gracias a la estabilidad del backend.

Sprint 2:

Las tareas de integración de PayPal retrasaron el avance real los días 1 y 2 (manteniendo los 40 SP intactos), pero una vez solucionadas las credenciales de sandbox, el quemado de puntos fue constante.

Sprint 3:

El despliegue a producción en Render y Vercel se programó con antelación, lo que permitió que la curva de progreso descendiera de forma óptima a lo largo del Sprint.
